



Инжиниринг
Строительство
Обслуживание


21.01.2020

Период: 01.01 - 21.04.2020


Строительство путепровода на автодороге № 1 МИР
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПУТЕПРОВОД

Уровень	Название	Начало	Окончание	БАЗОВОЕ - Бюджет проекта	Бюджет проекта [Факт]	Янв 2020	Фев 2020	Мар 2020	Апр 2020
1	Строительство путепровода на автодороге № 1 МИР	01.01.20	21.04.20	58 827 713	63 906 633				
2	КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА ПУТЕПРОВОД	20.04.20	20.04.20						
2	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПУТЕПРОВОД	20.04.20	21.04.20	3 668 978					
2	ГРАФИК КОНТРАКЦИИ ПУТЕПРОВОД	20.01.20	21.04.20						
2	АВТОРСКИЙ НАДЗОР ПУТЕПРОВОД	20.04.20	21.04.20	104 726					
2	ПОСТАВКА ТМЦ ПУТЕПРОВОД	20.04.20	21.04.20	4 076 079					
2	АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПУТЕПРОВОД	20.04.20	21.04.20	849 912					
2	ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПУТЕПРОВОД	01.01.20	21.04.20	50 128 019	63 906 633				
3	Переустройство трамвайных путей и контактных систем	06.03.20	21.04.20	2 901 448	3 009 404				
3	Демонтажные работы	10.01.20	21.04.20	1 009 775	1 588 842				
3	Усиление опор	01.01.20	21.04.20	2 419 284	1 226 664				
3	Общестроительные работы	01.01.20	21.04.20	43 797 512	58 081 723				


Фаза "ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПУТЕПРОВОД".
Показатель "Бюджет проекта". Анализ освоенных объемов (период 01.01-21.04.2020)

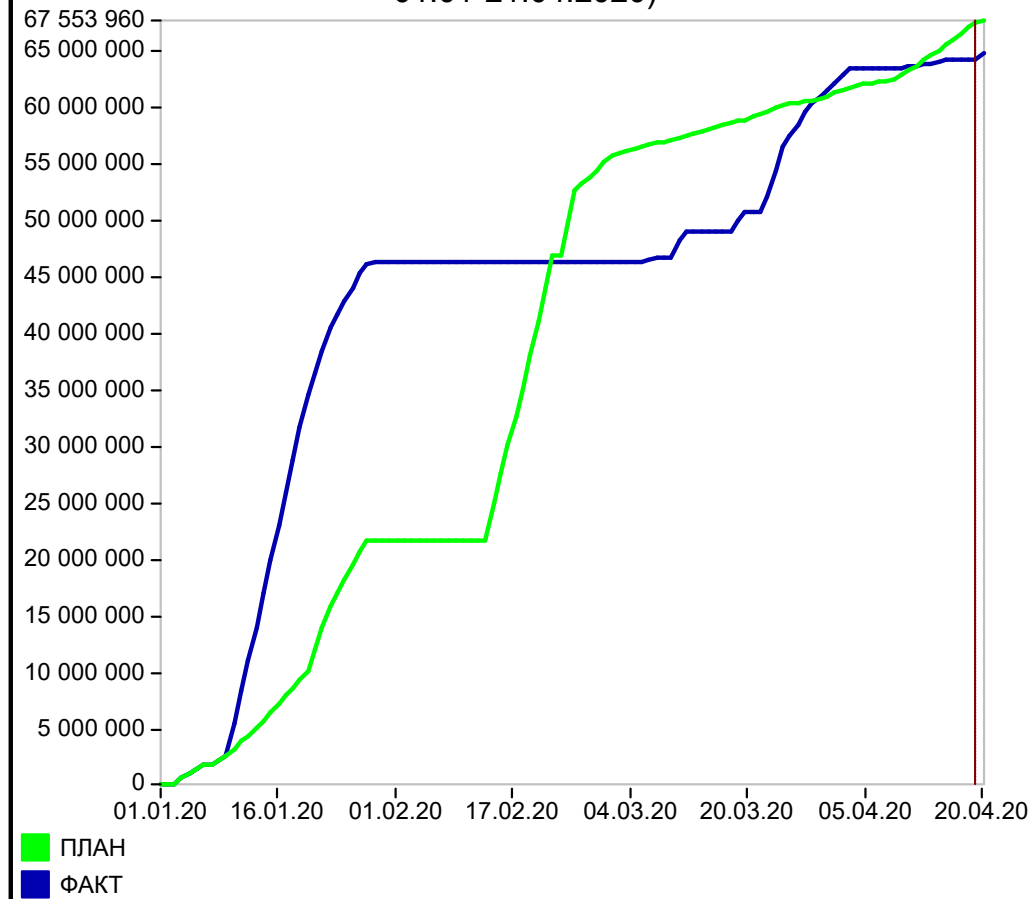


Фаза "Переустройство трамвайных путей и контактных систем";
Период: 01.01 - 21.04.2020; Показатель "Бюджет проекта" -
Анализ освоенных объемов

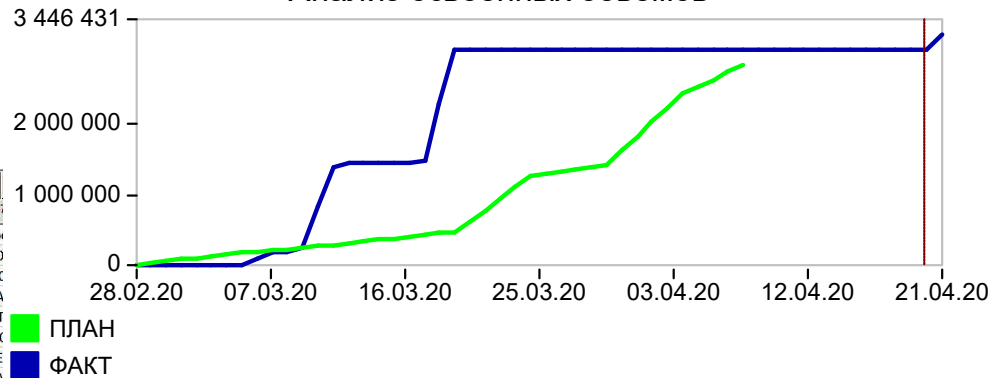


Фаза "Демонтажные работы"; Период: 01.01 - 21.04.2020;
Показатель "Бюджет проекта" - Анализ освоенных объемов

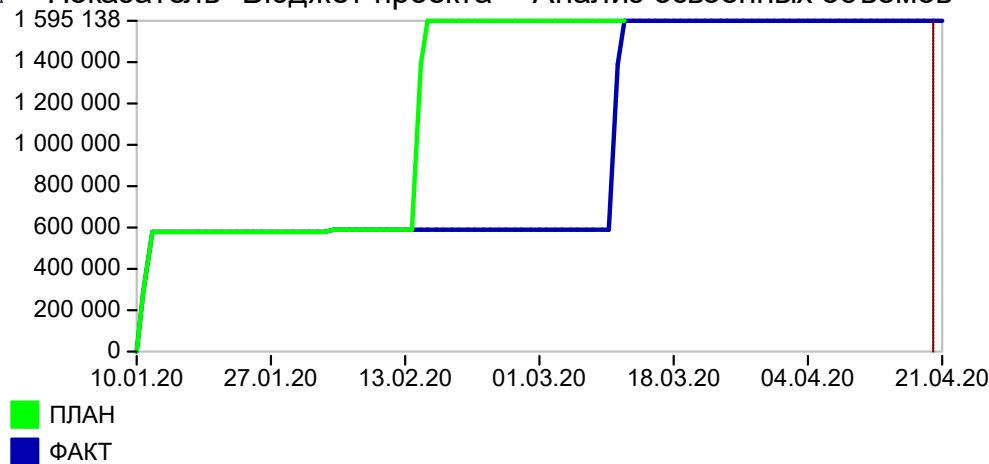

Фаза "Усиление опор"; Период: 01.01 - 21.04.2020; Показатель
"Бюджет проекта" - Анализ освоенных объемов

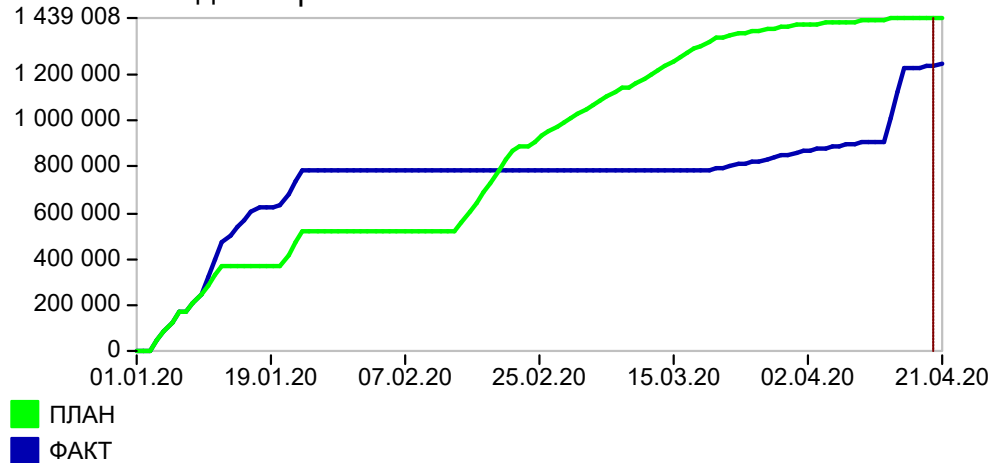

Фаза "Общестроительные работы"; Период: 01.01 - 21.04.2020;
Показатель "Бюджет проекта" - Анализ освоенных объемов

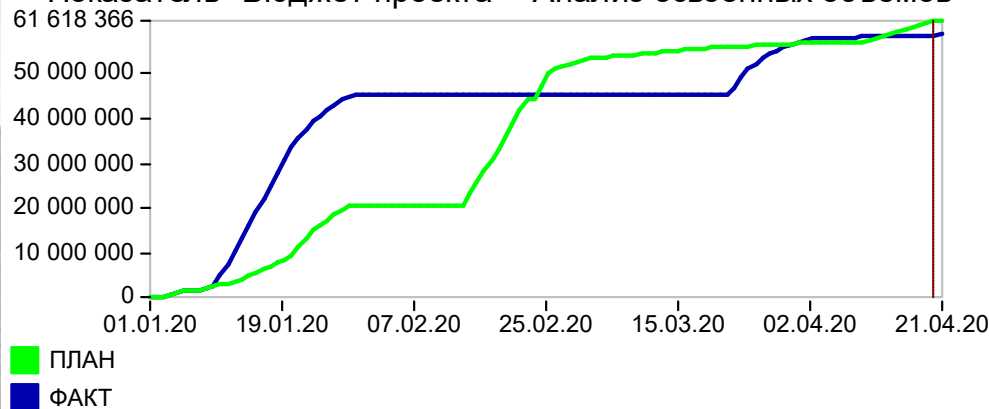


Бюджет проекта [План]

Демонтажные работы	1 009 775
Усиление опор	2 419 284
Переустройство трам	2 901 448
Общестроительные р	43 797 512

Бюджет проекта [Факт]

Усиление опор	1 226 664
Демонтажные работы	1 588 842
Переустройство трам	3 009 404
Общестроительные р	58 081 723

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПУТЕПРОВОД Бюджет проекта
[Итог]

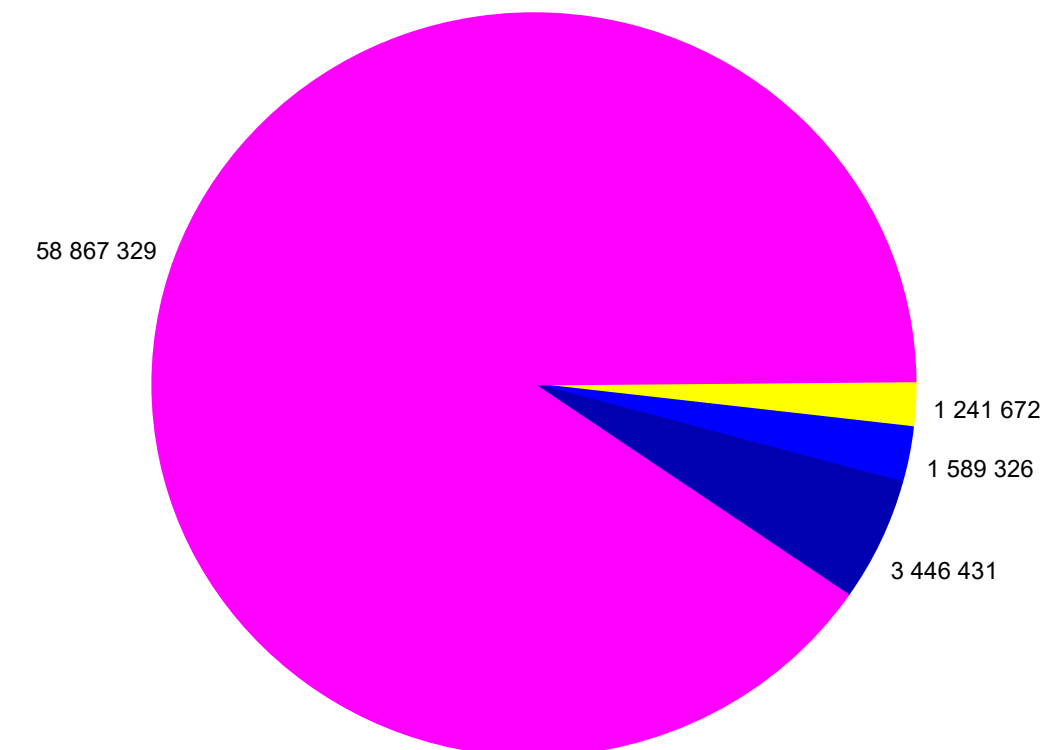

1 241 672	Усиление опор
1 589 326	Демонтажные работы
3 446 431	Переустройство трамвайных путей и контактных систем
58 867 329	Общестроительные работы
